

Cronograma de Sprints — Chatbot de Triagem do SAV

Oct 4, 2026 · @Gabriel

Visão geral

O projeto entrega, em 10 semanas (05/10 a 11/12/2026), um chatbot que responde às dúvidas recorrentes do SAV e encaminha ao atendente humano os casos específicos ou graves.

- **Problema:** os tickets são atendidos por ordem de chegada, sem limite de envio, então dúvidas simples (faltas, notas, calendário, grade) atrasam reclamações sérias.
- **Solução:** triagem automática — o bot responde o que é corriqueiro e escala o resto, já com a dúvida resumida e uma prioridade sugerida.
- **Método:** Scrum adaptado, com 6 sprints: a Sprint 0 e a Sprint 5 duram 1 semana; as Sprints 1 a 4 duram 2 semanas.
- **Premissa de datas:** início na segunda, 05/10, e entrega final na semana de 07/12. A data final é sexta-feira, 11/12/2026.
- **Feriados no período:** 12/10, 02/11 e 20/11 — sprints com feriado têm escopo um pouco menor.

Papéis da equipe

Cada integrante é dono de uma frente técnica, e todos escrevem a parte da monografia sobre o que construíram.

Integrante	Frente principal	Papel no Scrum	Responsabilidades
David	Back-end e integração	Scrum Master	API do chatbot, banco de dados, regras de encaminhamento ao humano, deploy
Gabriel	Inteligência / PLN	Desenvolvedor	Classificação de intenções, base de conhecimento, detecção de casos graves, respostas do bot
Ian	Front-end e UX	Desenvolvedor	Interface do chat, painel do atendente, protótipos, acessibilidade


Integrante	Frete principal	Papel no Scrum	Responsabilidades
Indaiá	Requisitos, qualidade e documentação	Product Owner	Levantamento com alunos e SAV, backlog, testes, métricas, organização da monografia

O Product Owner (Indaiá) prioriza o backlog e valida as entregas com o orientador; o Scrum Master (David) conduz as cerimônias e remove impedimentos.

Cronograma resumido

Entrega final em 11/12, ao fim de 6 sprints

Cronograma do TG por semana, 2026

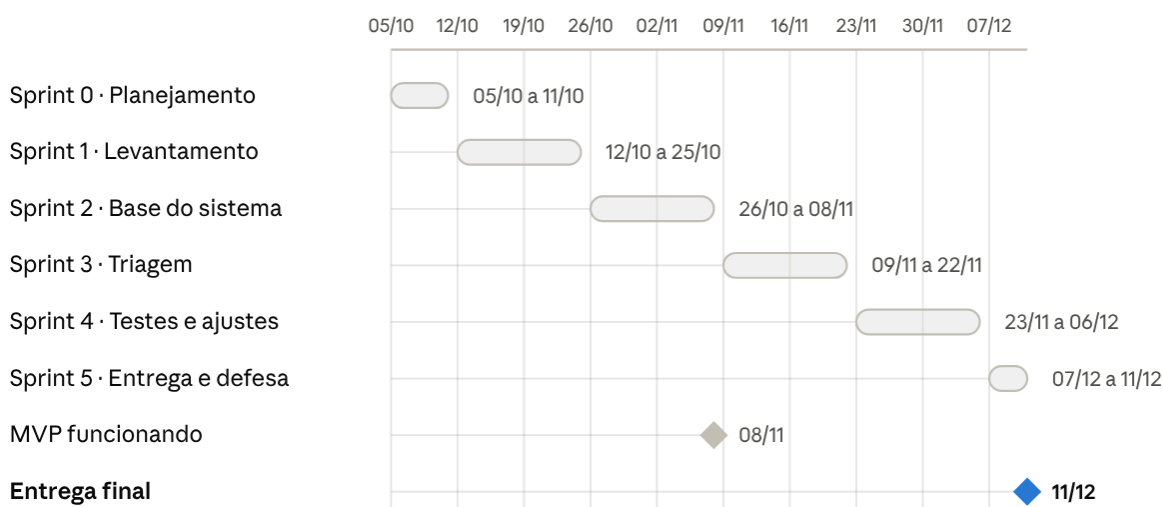

cronograma · 6 sprints, 05/10 a 11/12/2026

O MVP fica pronto no fim da Sprint 2 (08/11); as duas sprints seguintes completam a triagem e validam o bot com alunos.

Tarefas por sprint

Sprint 0 — Planejamento (05/10 a 11/10)

Meta: escopo fechado, ferramentas definidas e backlog inicial pronto.

Integrante	Tarefas
David	Criar repositório e quadro do projeto (GitHub + Trello/Jira); propor arquitetura (front, API, banco, módulo de IA)
Gabriel	Pesquisar abordagens de chatbot (regras, classificador de intenções, LLM com RAG) e comparar custo e precisão
Ian	Pesquisar padrões de interface de chatbot; esboçar os primeiros wireframes
Indaiá	Escrever a visão do produto e o escopo; agendar conversa com a equipe do SAV; montar o backlog inicial

Entrega: documento de escopo, arquitetura proposta e backlog priorizado.

Sprint 1 — Levantamento e prototipação (12/10 a 25/10)

Meta: saber quais dúvidas o bot vai responder e como a conversa vai ser.

Integrante	Tarefas
David	Modelar o banco (usuários, conversas, mensagens, tickets escalados); configurar ambiente de desenvolvimento
Gabriel	Classificar uma amostra de tickets do SAV por categoria; definir as intenções do bot (faltas, notas, calendário, grade, matrícula, atestado, reclamação etc.)
Ian	Protótipo navegável no Figma do chat e do painel do atendente
Indaiá	Aplicar questionário com alunos e entrevistar o SAV; escrever requisitos funcionais e não funcionais; iniciar a introdução da monografia

Entrega: lista de intenções, requisitos, protótipo e modelo de dados.

Sprint 2 — Base do sistema (26/10 a 08/11)

Meta: um chat funcionando de ponta a ponta, ainda com respostas simples.

Integrante	Tarefas
David	API de mensagens (receber pergunta, devolver resposta, salvar histórico); autenticação básica
Gabriel	Montar a base de conhecimento (regulamento, calendário, grades, regras de falta e nota); primeira versão do classificador de intenções
Ian	Implementar a tela de chat conectada à API
Indaiá	Plano de testes e casos de teste por intenção; escrever o referencial teórico (chatbots, PLN, atendimento acadêmico)

Entrega: MVP — o aluno pergunta e recebe resposta para pelo menos 2 intenções.

Sprint 3 — Triagem e encaminhamento (09/11 a 22/11)

Meta: o bot cobre todas as dúvidas corriqueiras e sabe quando chamar um humano.

Integrante	Tarefas
David	Fluxo de escalonamento: gerar ticket para o SAV com o histórico da conversa e a prioridade sugerida
Gabriel	Cobrir todas as intenções; detectar casos graves e baixa confiança (gatilhos de encaminhamento); resposta padrão quando o bot não sabe
Ian	Painel do atendente: fila de tickets escalados, ordenada por prioridade
Indaiá	Executar testes por intenção e registrar bugs; escrever a metodologia da monografia

Entrega: triagem completa — responde, ou escala com prioridade.

Sprint 4 — Testes com usuários e ajustes (23/11 a 06/12)

Meta: sistema validado com alunos reais e pronto para apresentar.

Integrante	Tarefas
David	Deploy em ambiente acessível; correção de bugs; logs e métricas de uso

Integrante	Tarefas
Gabriel	Ajustar respostas e intenções a partir dos erros encontrados; medir a taxa de acerto do classificador
Ian	Ajustes de usabilidade, responsividade (celular) e acessibilidade
Indaiá	Organizar o teste piloto com alunos; aplicar questionário de satisfação; compilar resultados

Entrega: versão final do sistema e relatório de resultados (acerto, % de dúvidas resolvidas sem humano, satisfação).

Sprint 5 — Entrega e defesa (07/12 a 11/12)

Meta: monografia entregue e apresentação ensaiada.

Integrante	Tarefas
David	Documentação técnica (arquitetura, instalação); seção de desenvolvimento do back-end
Gabriel	Seção sobre o módulo de IA e a análise dos resultados
Ian	Slides da apresentação e vídeo ou roteiro da demonstração
Indaiá	Revisão final da monografia (ABNT), conclusão e trabalhos futuros; coordenar o ensaio da banca

Entrega: monografia final, slides e demonstração.

Rotina, critérios e riscos

Cerimônias

Cerimônia	Quando	Duração	Quem conduz
Planning	1º dia de cada sprint	1 h	Indaiá (PO)

Cerimônia	Quando	Duração	Quem conduz
Daily assíncrona	Seg, qua e sex, pelo grupo da equipe	5 min por pessoa	David (SM)
Review	Último dia da sprint, de preferência com o orientador	30 min	Todos
Retrospectiva	Logo após a review	20 min	David (SM)

Definição de pronto

Uma tarefa só é dada como pronta quando:

- o código está no repositório, revisado por outro integrante;
- foi testada nos casos de teste da intenção correspondente;
- a parte da monografia sobre ela foi escrita ou atualizada.

Riscos e pontos de atenção

- **Acesso a dados do aluno:** responder "quantas faltas eu tenho" exige integração com o sistema acadêmico, que pode não ser liberada. Plano B: o bot explica as regras e indica onde o aluno consulta seus próprios dados.
- **LGPD:** conversas podem conter dados pessoais e atestados médicos. Definir já na Sprint 1 o que é armazenado, por quanto tempo e quem acessa.
- **Amostra de tickets:** sem tickets reais do SAV, a lista de intenções fica baseada em suposição. Pedir uma amostra anonimizada na Sprint 0.
- **Respostas erradas:** o bot deve escalar sempre que tiver baixa confiança, em vez de arriscar uma resposta.
- **Monografia acumulada no fim:** por isso cada sprint tem uma seção escrita como entrega.
